

982101


La Capitanes (Huelva):

1619  
Contrato n° 188

3-VI-68.

26-VI-68

7-13-18  
3718-05 / *[Signature]* 999

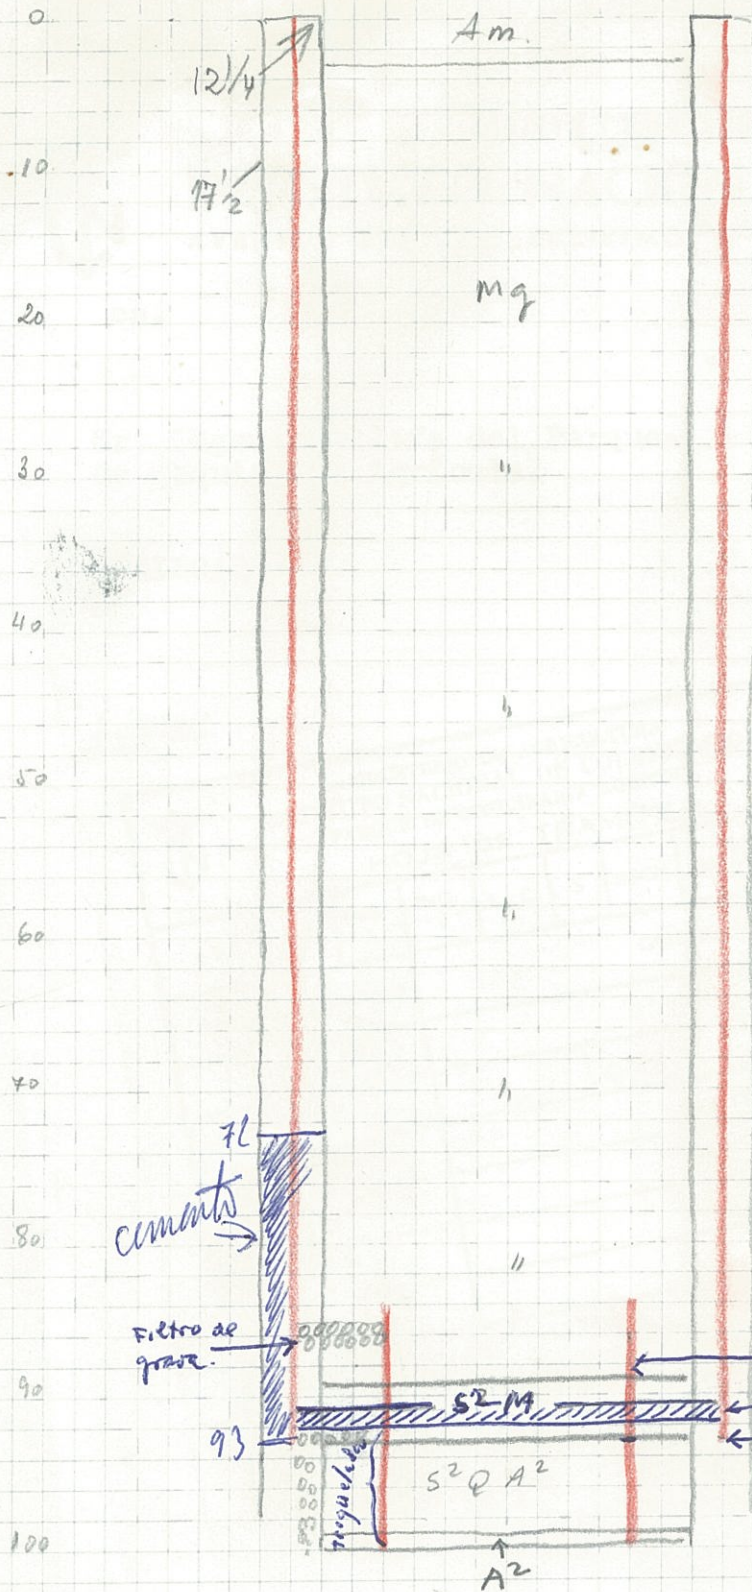

200/210 m/m.  
 tapón madera encima de la lechada de cemento 1000 Kg  
 800 Agua.  
 Entuba 93 m. de 342/356 m/m φ  
 A continuación desciende un tapón de madera hasta el fondo de la tubería.  
 fraguado cemento lo perfora con 12 1/4 φ hasta el m - 93 m.  
 El día 18 limpia con valvula y queda el NL a 18 m.  
 Día 19 valvula el N = 71 m no recupera  
 " " " el N a 72,5 en 30' recupera 0,25 mts  
 A continuación se inspecta tripoli con inyección de agua.
